




# Relatório Mensal

# Execução de

# obras e serviços

---

MÊS: OUTUBRO  
ANO: 2021

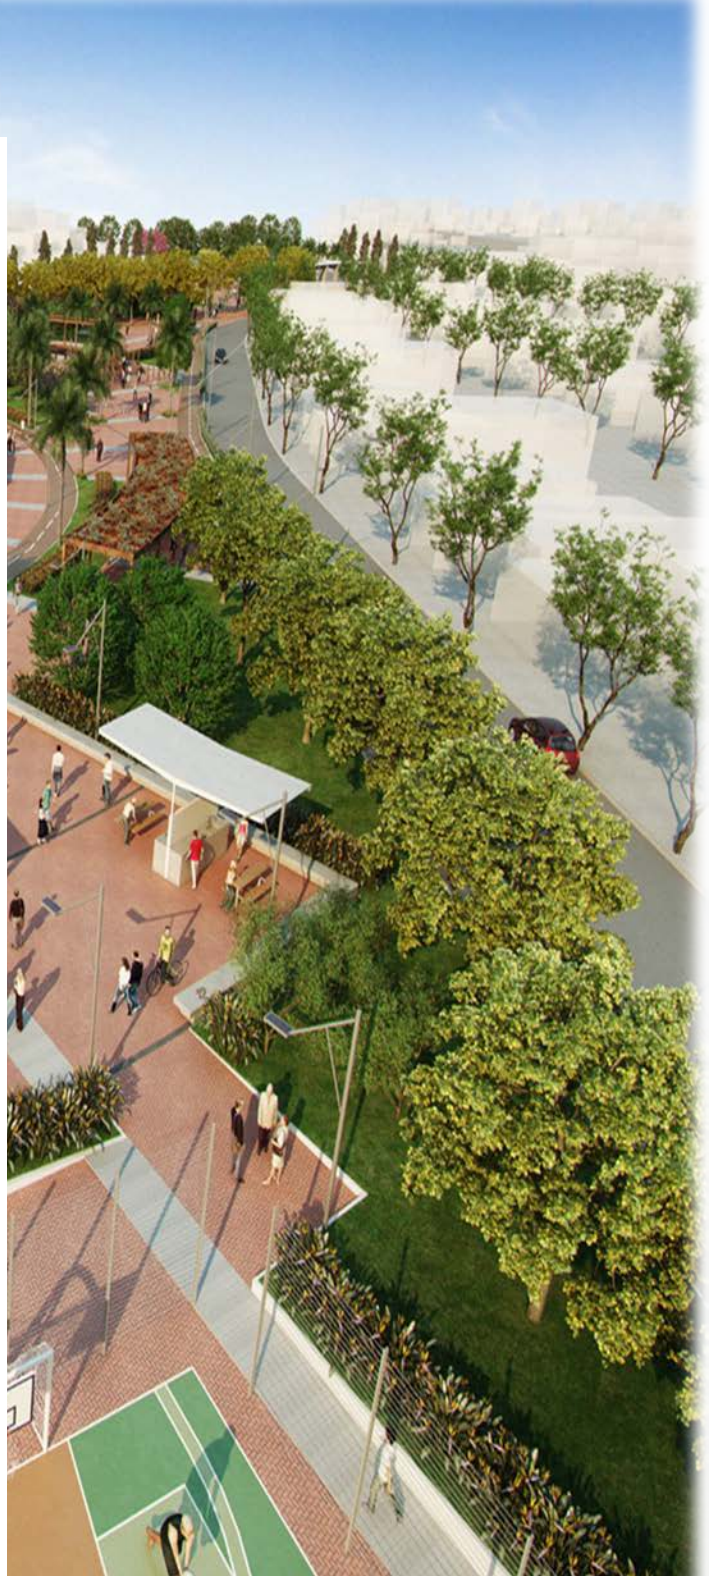

---

**Objeto da obra:** RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES NO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA-PA

**Nome do contratado:** CONSTRUAMEC – Construo Agricultura Mecanizada S/A

**CNPJ do contratado:** 22.983.316/0001-83

**Local da Execução da obra:** Estradas Vicinais

**Origem do Recurso:** Ministerio do Desenvolvimento Regional

**Modalidade da licitação:** Concorrência pública

**Número do Processo Licitatório:** 002.2018.PMM.SEDURB

**Data início da obra:** 19/01/2018

**Data final da obra:** 11/03/2023

**Valor total da Obra:** R\$ 14.576.899,12

**Valor total aplicado:** R\$ 10.154.678,75

**Valor a desembolsar:** R\$ 4.422.220,37

**Percentual total aplicado:** 69,66%

**Percentual mensal aplicado:** %07,79

**Valor aplicado no mês Vigente:** R\$ 1.136.479,75
