




Relatório Mensal

Execução de

obras e serviços

MÊS: OUTUBRO
ANO: 2023

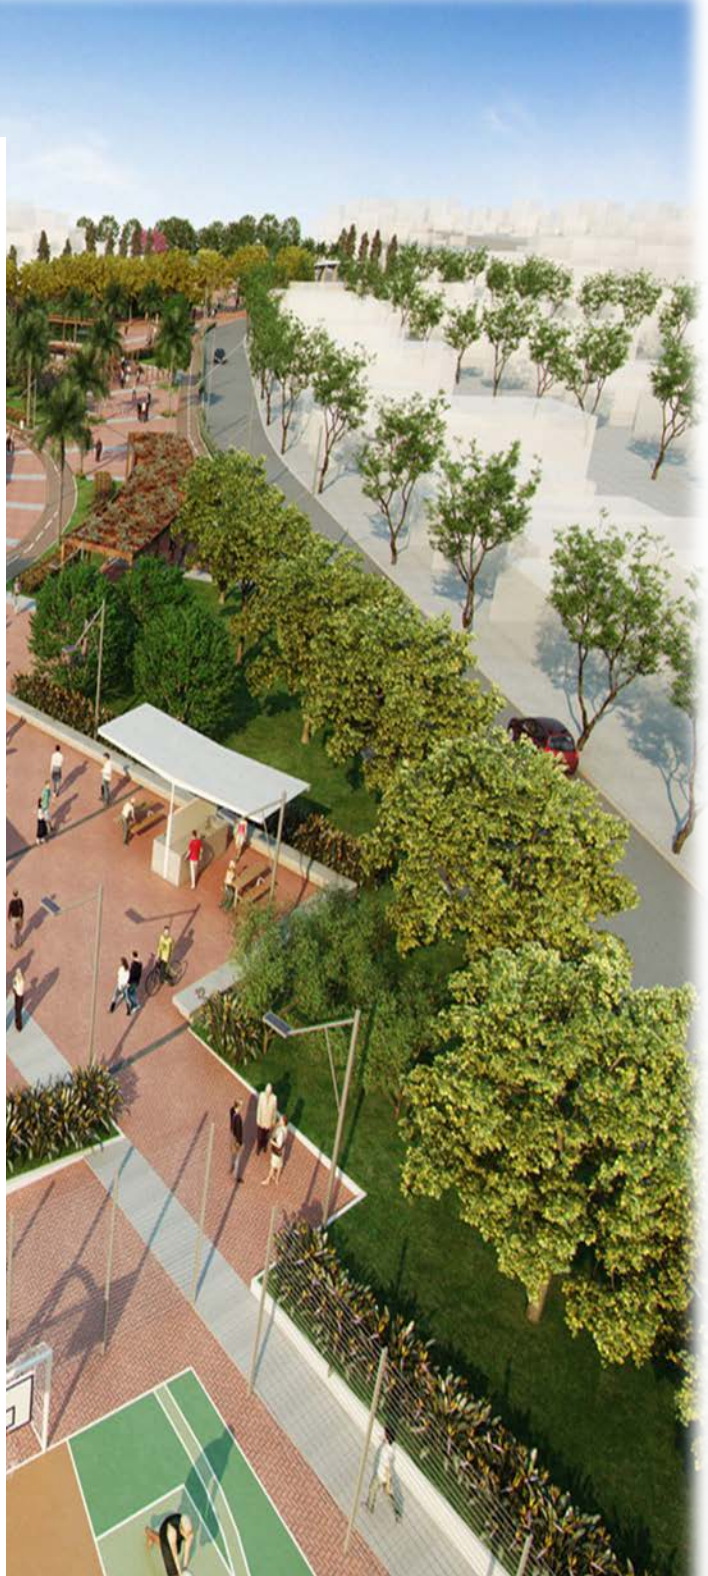

Número do convênio: 850054/2017

Objeto da obra: CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR COM ÁREA ABERTA PARA COMERCIALIZAÇÃO LIVRE NO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA/PA PARA O FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA PRODUTIVA OFERECENDO ESPAÇOS ADEQUADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS REGIONAIS.

Nome do contratado: GROSS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ do contratado: 19.427.604/0001-47

Local da Execução da obra: Rua Siqueira Mendes, entre Travessa Miguel de Almeida e Travessa Alexandre Castro

Origem do Recurso: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Modalidade da licitação: Tomada de preços

Número do Processo Licitatório: 001.2018.PMM.SEDURB

Data início da obra: 16/01/2018

Data final da obra: 16/12/2023

Valor total da Obra: R\$ 859.390,40

Valor total aplicado: R\$ 19.031,53

Valor a desembolsar: R\$ 840.358,87

Percentual total aplicado: 02,21%

Percentual mensal aplicado: 0,0%

Valor aplicado no mês Vigente: R\$ 0,0

Transferências recebidas: R\$ 0,0

Transferências realizadas: R\$ 0,0

Número do convênio: 865857/2018

Objeto da obra: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA DEUSDEDIT S DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA/PA

Nome do contratado:

CNPJ do contratado:

Local da Execução da obra: Rua Deusdedit S de Oliveira

Origem do Recurso: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Modalidade da licitação: Sem licitação

Número do Processo Licitatório:

Data início da obra: 20/12/2018

Data final da obra: 16/12/2023

Valor total da Obra: R\$ 808.000,00

Valor total aplicado: R\$ 0,0

Valor a desembolsar: R\$ 0,0

Percentual total aplicado: 0,0%

Percentual mensal aplicado: 0,0%

Valor aplicado no mês Vigente: R\$ 0,0

Transferências recebidas: R\$ 0,0

Transferências realizadas: R\$ 0,0

Número do convênio: 062/2022

Objeto da obra: CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL DE MOCAJUBA

Nome do contratado: ANTOCAR ENGENHARIA EIRELI – EPP

CNPJ do contratado: 04.074.289/0001-44

Local da Execução da obra: Rua Manoel de Souza Furtado

Origem do Recurso: SESPA

Modalidade da licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número do Processo Licitatório: Nº 001.2022.PMM.SESAU

Data início da obra: 29/06/2022

Data final da obra: 28/12/2023

Valor total da Obra: R\$ 16.444.227,69

Valor total aplicado: R\$ 3.706.830,48

Valor a desembolsar: R\$ 12.737.392,21

Percentual total aplicado: 22,54%

Percentual mensal aplicado: 0,0%

Valor aplicado no mês Vigente: R\$0,0

Transferências recebidas: R\$ 0,0

Transferências realizadas: R\$ 0,0
